Avance hacia la versión 1.0

Buk Learning, equipo 3: Guillermo Mora, José Montesino y Pablo Pinto. Ficha de avance 04, semana 10 de 18.

¿DÓNDE ESTAMOS?

40 % de avance real reconocido.
Faltan 60 puntos para la versión 1.0.


0 % — 100 %

Terminadas y comprobadas	Funcionan parcialmente	No iniciadas	Semanas restantes
2	**4**	**3**	**8**
20 % del peso, todo reconocido	40 % del peso, la mitad reconocida	40 % del peso	hasta el 04-12

¿CÓMO LLEGAREMOS?

Avance acumulado esperado en las ocho semanas


Semanas del 12-10 al 04-12; las cuatro últimas, para integrar, probar y validar.

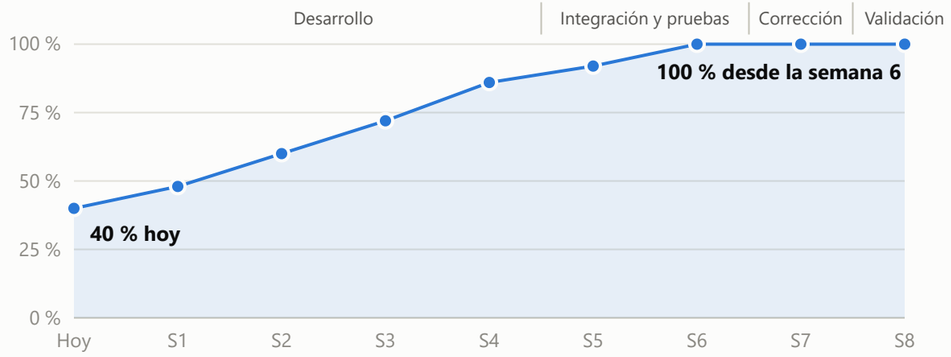

¿QUÉ NOS FALTA?

Funcionalidades de la versión 1.0: peso y avance reconocido

Cada barra mide el peso de la funcionalidad; la parte oscura es lo que ya está reconocido según la escala del docente.

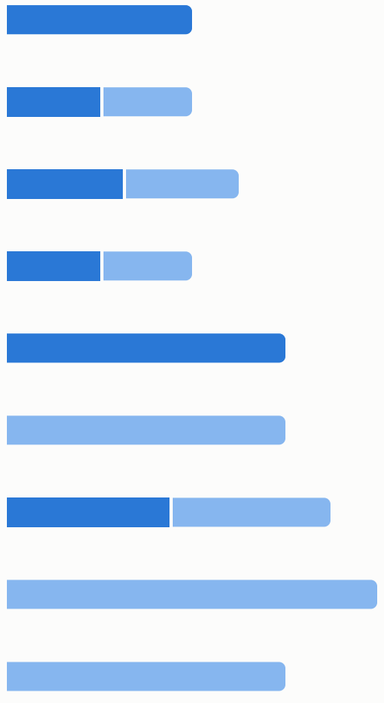

	Iteración		
Diseño de la solución	Iteración 01	**8** de 8 %	Terminada
Inicio de sesión y roles	Iteración 02	**4** de 8 %	Parcial
Base de datos de la cartera	Iteración 02	**5** de 10 %	Parcial
Ingreso de datos	Iteración 02	**4** de 8 %	Parcial
Cálculo de la siniestralidad	Iteración 03	**12** de 12 %	Terminada
Integración de fuentes	Pendiente	**0** de 12 %	No iniciada
Tablero descriptivo	Iteración 02	**7** de 14 %	Parcial
Modelo predictivo	Pendiente	**0** de 16 %	No iniciada
Tablero de decisión	Pendiente	**0** de 12 %	No iniciada
Total		**40** de 100 %	

Avance reconocido · Peso por completar

Lo que más pesa en lo que falta: modelo predictivo (16 %), integración de las fuentes (12 %) y tablero de decisión (12 %), además de cerrar las cuatro parciales (20 %).

Principal riesgo: todavía no hay acceso a los datos reales ni a los reportes de la aseguradora. Si no llegan en la semana 3, el modelo se entrena con datos sintéticos documentados.

Escala del docente: terminada y comprobada 100 %, funciona parcialmente 50 %, iniciada 25 %, no iniciada 0 % del peso.

Evidencia: github.com/AleisGit/APT122-Portafolio y la aplicación publicada.
